



Audit Diagnostik Operasional: Dekonstruksi Siklus Pembukaan Cabang (UPC)

Membongkar Bias Data Historis dan Mengisolasi
Risiko Bottleneck pada Periode 2024–2026.

[Periode Analisis]: Januari 2024 – Juli 2026
[Total Dataset]: 995 Transaksi
[Cakupan]: 84 Kabupaten/Kota



Permukaan yang Terlihat Stabil: Siklus Rata-Rata 68 Hari

995

Total Pengajuan Cabang
(Jan 2024 - Jul 2026)

68,3 Hari

Rata-rata Total Proses
(Pengajuan → Grand Opening)

63,8%

Rata-rata Kepatuhan SLA
Renovasi Keseluruhan

Dalam agregat, total waktu pembukaan cabang terlihat konsisten di kisaran 67–70 hari selama tiga tahun terakhir. Namun, agregat ini menyembunyikan pergeseran struktural di dalamnya.

Pergeseran Struktural yang Tersembunyi di Balik Siklus 68 Hari

Annotated Heatmap Table

Tahun	Jml Pengajuan	Tunggu Nego	Avg Nego	Tunggu Renov	Avg Renovasi	Tunggu Open	Total Waktu
2024	318	3	19	4	17	14	70
2025	435	2	22	4	19	9	67
2026	242	11	24	6	24	6	68
Grand Total	995	8	22	4	20	10	68

Stabilitas Semu:
Siklus terlihat konstan di angka rata-rata 68,3 hari.

↑ Fase Pengerjaan Eksternal Membengkak.

↓ Efisiensi Administratif Internal Membaik.

Efek Balon (The Balloon Effect): Efisiensi waktu yang kita menangkan dari penyusutan proses administratif (tunggu open) langsung tertelan oleh inefisiensi yang melebar pada proses aktif (negosiasi & renovasi).

Ilusi Efisiensi: Tren 2024–2025 Bukanlah Performa, Melainkan Blank Data



Fakta Audit:

Tren efisiensi diskon yang seolah membaik secara drastis adalah salah.

Diagnostic Note:

`rental_price = asking_price` pada 100% transaksi 2024 dan **97,7%** transaksi 2025.

Kesimpulan:

Diskon tidak dicatat dengan benar sebelum kohort 2026. Analisis efisiensi **sejati HANYA** dapat dinilai menggunakan data 2026 (ketika pencatatan mencapai tingkat validitas).

Krisis Tersembunyi: Kepatuhan SLA Renovasi Menurun 15,4 Poin




Dekomposisi 68 Hari: Mengisolasi 60% Faktor Utama



Upaya percepatan yang paling berdampak (highest leverage) ada pada penguatan kapasitas manusia (Negosiasi) dan pengelolaan vendor (Renovasi). Tahapan administratif sudah berada pada batas wajar.

Mitos Negosiasi: Waktu Tambahan Tidak Membeli Diskon Lebih Besar

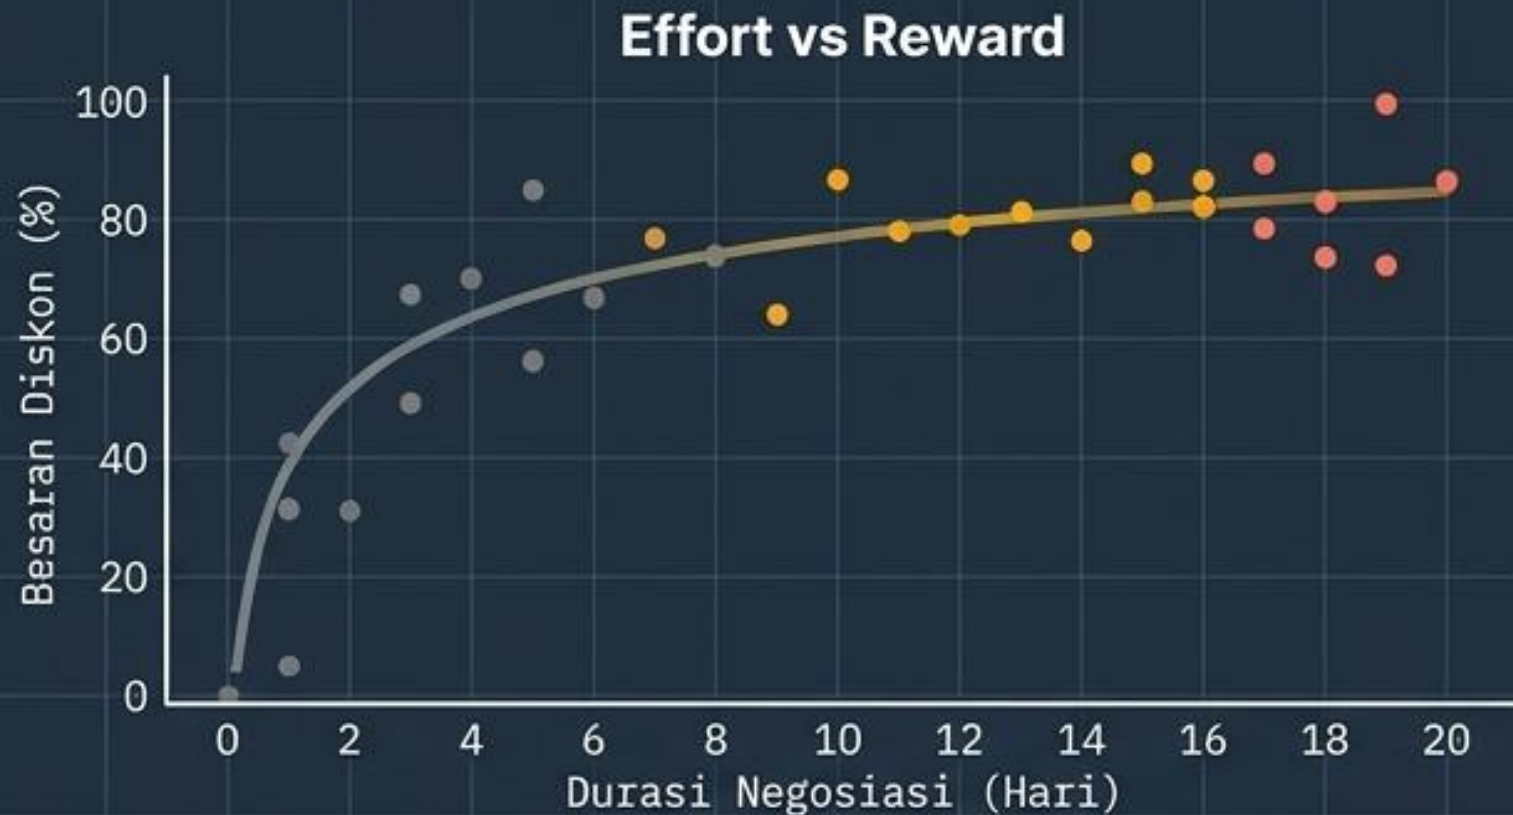

Korelasi (r) = 0,305 (Signifikansi Lemah-Sedang).

- Lebih dari 85% variasi besaran diskon ditentukan oleh faktor di luar durasi waktu negosiasi semata.

Tactical Implication

Memperpanjang waktu negosiasi berisiko diminishing returns. Menetapkan batas SLA Negosiasi maksimal 17 hari tidak akan membuang potensi diskon signifikan, namun akan mempercepat total siklus pembukaan cabang secara drastis.

Kapasitas Eksekusi Manusia: Bonita vs Mirza (Kohort 2026)

Uji Mann-Whitney $p < 0,001$ (Signifikan Kuat).

Bonita (n=109)

Rata-rata Durasi:	23,6 Hari
Rata-rata Diskon:	8,2%
Median Diskon:	0,0%

Mirza (n=113)

Rata-rata Durasi:	24,2 Hari
Rata-rata Diskon:	14,1%
Median Diskon:	13,3%

Waktu eksekusi mereka nyaris identik (selisih 0,6 hari), tetapi Mirza menghasilkan efisiensi hampir dua kali lipat. Ini membuktikan perbedaan pendekatan taktis dan pemanfaatan leverage, bukan soal jam kerja.


Realitas Geospasial: Leverage Properti Menentukan Diskon



Tim ekspansi wajib menggunakan 'Skor Kemudahan' sebagai matriks due diligence untuk menetapkan target waktu rasional per wilayah.

Peta Skor Kemudahan Negosiasi per Wilayah — Data 2026

(Komposit: Kecepatan Nego 50% + Efisiensi Diskon 50%, min. 2 transaksi)

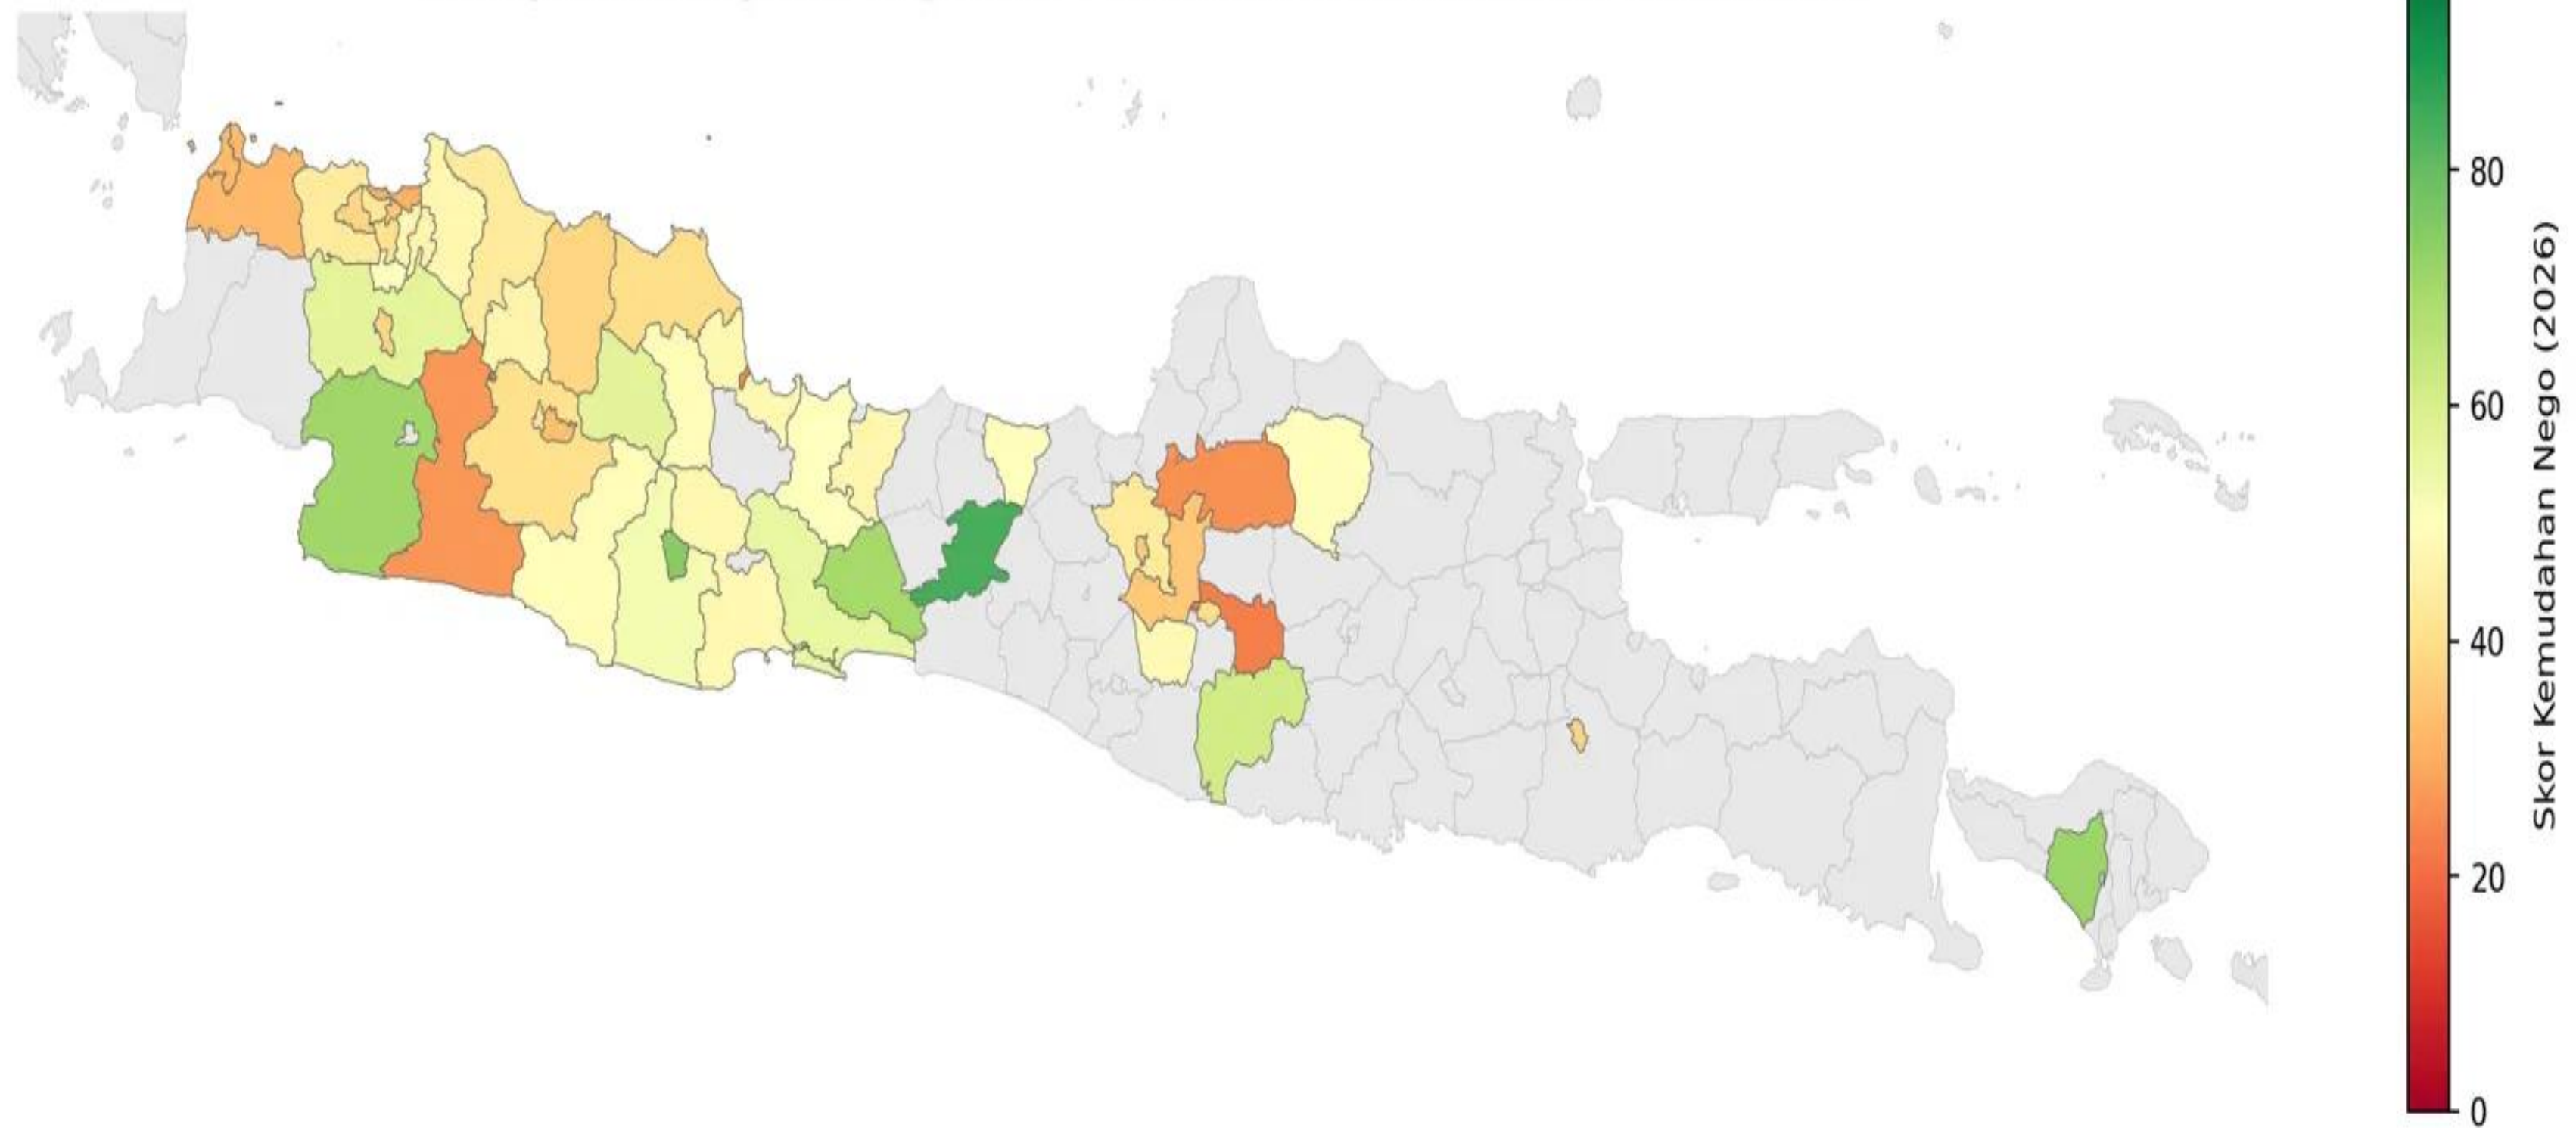

Peta Risiko Vendor: Ketidakseimbangan Volume dan Kinerja



Ketergantungan pada kontraktor dengan kinerja buruk mendistorsi SLA agregat seluruh perusahaan.

Mengisolasi Kegagalan: Trimo vs Sarjono

Sarjono

246 Pengerjaan
Rata-rata **14,4** Hari
89,0% Kepatuhan

Trimo

176 Pengerjaan
Rata-rata **25,8** Hari
36,9% Kepatuhan

Menepis Alasan Skala Proyek

1	Hipotesis:	Proyek Trimo mungkin memakan anggaran lebih besar sehingga lebih lambat.
2	Fakta Statistik:	Korelasi anggaran terhadap durasi hanyalah $r = 0,387$ (sedang). Lebar ruko $r = 0,040$ (tidak signifikan).
3	Kesimpulan:	Kesenjangan SLA 52% antara Sarjono dan Trimo tidak bisa dijelaskan oleh ukuran proyek. Ini adalah kegagalan kapasitas eksekusi riil dari Trimo.

Sintesis: Siklus 68 Hari Bukanlah Batas Alami (Artificially Bloated)



Bloat Equation

Ketidakefisienan Negosiasi (Waktu terbuang tanpa tambahan diskon)

+ Kegagalan SLA Kontraktor Berisiko Tinggi (Efek penundaan **Trimo**)

= **Ilusi Siklus 68 Hari.**

Paradigm Shift

Waktu bukanlah variabel penentu utama; Kapasitas Eksekusi adalah kuncinya. Mengkalibrasi ulang dua faktor manusia ini (standarisasi taktik ke level Mirza + redistribusi beban dari Trimo) akan **menyusutkan total** menyusutkan total siklus secara eksponensial.

Imperatif Strategis: 3 Tindakan Operasional Segera

Redistribusi Vendor (Immediate)

Kurangi volume proyek dari kontraktor Trimo. Alihkan kuota ke Sarjono dan Sendy untuk segera mengembalikan kepatuhan SLA ke atas 70%.

Pembatasan SLA Negosiasi (30 Hari)

Terapkan hard cap durasi negosiasi maksimal 17 hari. Data membuktikan waktu tambahan tidak sepadan dengan perolehan margin diskon.

Standarisasi Taktikal & Geospasial (90 Hari)

Gunakan matriks 'Skor Kemudahan Wilayah' sebagai due diligence sebelum menetapkan target diskon sewa di area Perkotaan Padat. Kloning taktik leverage Mirza untuk standarisasi tim.

Eksekusi rekomendasi ini tidak memerlukan investasi sistem TI baru, murni perbaikan tata kelola operasional dan redistribusi beban kerja.
